

BAUSTELLENDOKUMENTATION

Landhaus Sanierung 2. Etappe

PROJEKT

Baustellendokumentation 4 Mai 2025

ARBEITEN

BKP 115 Werkleitungen

BKP 211 Baumeister

BKP 222 Spengler

BKP 224 Bedachung

BKP 240 Heizung

BKP 250 Sanitär

31. Mai 2025

ERSTELLUNG

BAUSTELLENDOKUMENTATION

BKP 115 Werkleitungen




Der neue Elektroschacht vor der Trafostation wird betoniert.
Die Elektro- und Abwasserleitungen werden neu erstellt.



Die Gebäudeeinführung für die Elektroleitungen wird erstellt.
Die Gebäudeeinführung für die Fernwärmeleitung wird erstellt.

BKP 211 Baumeister

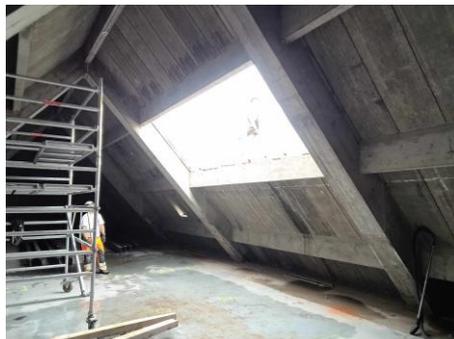

In der Ebene 4 wird eine neue Betondecke betoniert.
Im Dachgeschoss wurde eine Einbringöffnung geöffnet.



Im Dachgeschoss werden Lastverteilträger montiert.
Die statischen Massnahmen zur Verstärkung der Decken werden Brandschutzverkleidet.

BAUSTELLENDOKUMENTATION

BKP 222 Spengler



Eine bestehende Dachgaube wurde demontiert und der Zustand wird untersucht.

BKP 224 Bedachung



Im Bereich der Einbringöffnung werden die Dachziegel abgedeckt und Geländer eingerichtet.

BKP 240 Heizung



Die bestehende Heizung wurde zurückgebaut und entsorgt.



Die Neuinstallation der Heizverteilung ist in Arbeit. Die neuen Wärmespeicher wurden angeliefert.

BKP 250 Sanitär



Im Erdgeschoss wird ein neuer Kanalisationsschacht und neue Kanalisationsleitungen installiert.



Die neuen Nasszellen und die entsprechenden Abwasserleitungen werden installiert.
